

Informe 18/1998-C

Inversions reals en el Pressupost del Departament de Justícia

Exercici 1997



**Sindicatura de Comptes
de Catalunya**



Sindicatura de Comptes
de Catalunya

La secretària general

M. ÀNGELS BARBARÀ i FONDEVILA, Secretària General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,

C E R T I F I C O:

Que el dia 19 de gener de 1999, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la presidència del Síndic major, Sr. Ferran Termes i Anglès, amb l'assistència dels síndics Srs. Manuel Cardeña i Coma, Josep M. Carreras i Puigdengolas, Marià Nicolàs i Ros, Jordi Petit Fontserè, i Manuel Barrado i Palmer, actuant-hi com a secretària, la secretària general de la Sindicatura, Sra. M. Àngels Barbarà i Fondevila, i com a ponent el síndic Sr. Marià Nicolàs i Ros, amb deliberació prèvia, s'acordà aprovar l'informe de fiscalització 18/98-C relatiu a les inversions reals en el pressupost del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, exercici 1997.

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació, amb el vistiplau del Síndic major.

Barcelona, 3 de febrer de 1999

Vist i plau
EL SÍNDIC MAJOR



Plaça de Catalunya, 20
08002 Barcelona
Telèfon (93) 270 11 61
Fax (93) 270 15 70

ÍNDEX

ABREVIACIONS	6
1. INTRODUCCIÓ.....	7
1.1. INTRODUCCIÓ A L'INFORME	7
1.1.1. Objecte i abast	7
1.1.2. Metodologia i limitacions.....	7
1.2. INTRODUCCIÓ A LES ACTUACIONS FISCALITZADES	8
1.2.1. Estructura i funcions de la Subdirecció General d'Obres i Patrimoni	8
1.2.2. Normativa reguladora	10
2. DESPESES PER INVERSIONS REALS	11
2.1. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES	11
2.2. OBLIGACIONS RECONEGUDES	13
2.2.1. Aspectes generals	13
2.2.2. Inversions en terrenys i béns naturals	14
2.2.3. Inversions en edificis i altres construccions	15
2.2.4. Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge.....	19
2.2.5. Inversions en material de transport.....	20
2.2.6. Inversions en mobiliari i estris	21
2.2.7. Inversions en equips de procés de dades.....	22
3. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ ESTABLERT	23
3.1. CONTRACTES D'OBRES	23
3.1.1. Actuacions preparatòries.....	23
3.1.2. Adjudicació	24
3.1.3. Formalització del contracte.....	25
3.1.4. Execució i finalització de les obres	25
3.1.5. Modificació de contracte.....	26
3.2. CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DE BÉNS HOMOLOGATS	26
4. OBRES FISCALITZADES	27
4.1. EDIFICI PALAU DE JUSTÍCIA.....	27
4.2. EDIFICI JUDICIAL DE REUS.....	31
4.3. EDIFICI JUDICIAL DE MATARÓ	35
4.4. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (FASE I).....	38
4.5. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (COMPLEMENTARI FASE I)	41
4.6. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (FASE II)	43
4.7. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (COMPLEMENTARI FASE II)	46
5. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS	48
6. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS.....	49

ABREVIACIONS

BOE:	Boletín Oficial del Estado
CIGESA:	Centre Informàtic de la Generalitat, SA
DG:	Direcció General
DOCE:	Diari Oficial de les Comunitats Europees
DOGC:	Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
IVA:	Impost sobre el valor afegit
LCAP:	Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques
MPTA	Milions de pessetes
PTA	Pessetes
SGOP:	Subdirecció General d'Obres i Patrimoni
UTE:	Unió Temporal d'Empreses

1. INTRODUCCIÓ

1.1. INTRODUCCIÓ A L'INFORME

1.1.1. Objecte i abast

D'acord amb la normativa vigent, aquesta Sindicatura de Comptes emet el present informe recollint el resultat del treball de fiscalització dut a terme sobre el conjunt de les despeses registrades durant l'exercici 1997 per Inversions reals en el pressupost del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La revisió s'ha centrat en aquelles actuacions que són gestionades per la Subdirecció General d'Obres i Patrimoni (SGOP) dependent de la Secretaria General d'aquell Departament.

El treball ha estat orientat bàsicament cap a l'aconseguiment dels objectius següents:

- Revisió del tractament comptable i pressupostari de les inversions realitzades.
- Anàlisi del compliment de la legalitat vigent aplicable en relació a les despeses efectuades.
- Avaluació del sistema de gestió establert per al tractament dels diferents tipus de despeses analitzades.

1.1.2. Metodologia i limitacions

La revisió s'ha fonamentat en l'estudi previ dels sistemes de gestió establerts i la verificació posterior del seu funcionament a la pràctica, mitjançant el seguiment en detall d'una mostra d'expedients seleccionats.

No hi ha hagut cap limitació quant a l'abast i aplicació dels procediments que hem cregut adients en la realització del treball de camp, que s'ha dut a terme a les dependències de la Subdirecció General d'Obres i Patrimoni de la Secretaria General del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, durant el segon trimestre de 1998. En tot moment l'ens fiscalitzat ha mostrat una actitud positiva de col·laboració.

En l'apartat 2 es mostra el crèdit inicial, les modificacions pressupostàries i les obligacions reconegudes per Inversions reals durant l'exercici 1997.

L'apartat 3 d'aquest informe inclou la descripció i avaluació dels diferents sistemes de gestió establerts.

L'apartat 4 detalla les característiques més significatives de les obres seleccionades en la fiscalització.


Finalment, com a conclusió del treball realitzat, l'apartat 5 recull una sèrie d'observacions i recomanacions que s'han posat de manifest com a resultat de la revisió.

1.2. INTRODUCCIÓ A LES ACTUACIONS FISCALITZADES

1.2.1. Estructura i funcions de la Subdirecció General d'Obres i Patrimoni

1.2.1.1. Estructura

L'organigrama de la SGOP és el següent:

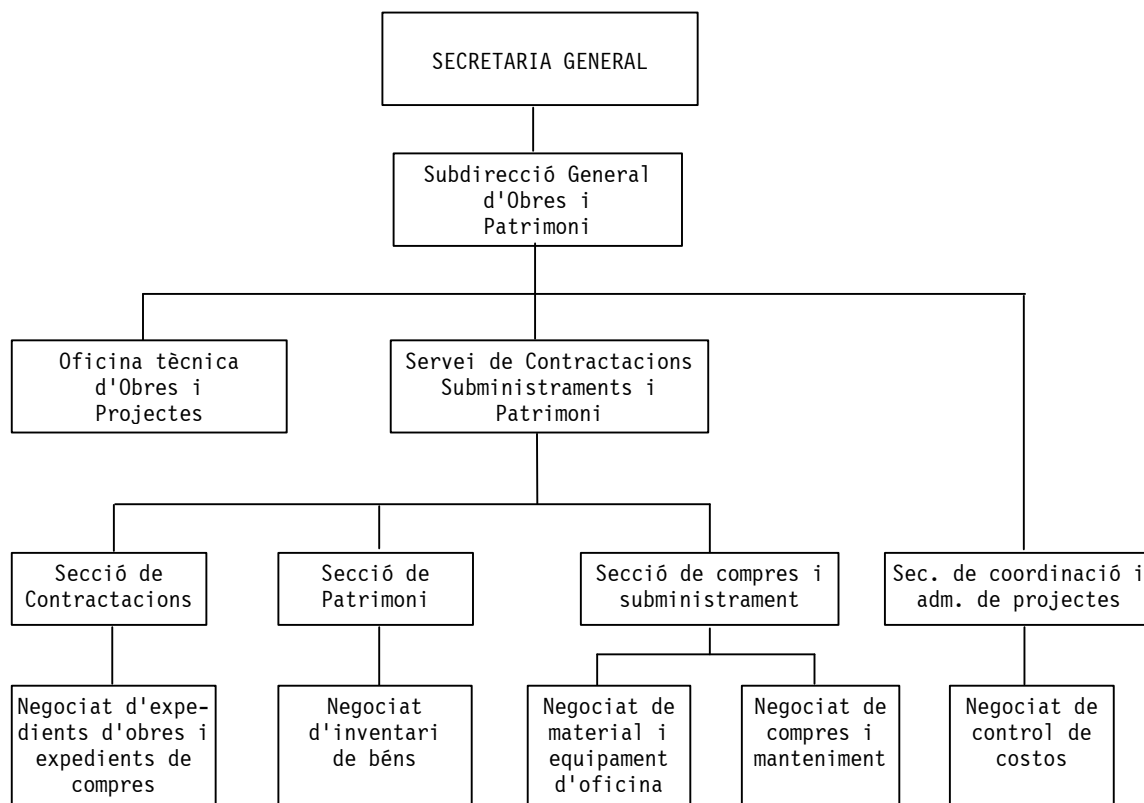

1.2.1.2. Funcions

A continuació resumim les funcions generals que tenen assignades els diferents òrgans que formen part de l'estructura de la SGOP.

La SGOP s'encarrega de preparar i executar les polítiques i plans d'inversió i equipaments, i de gestió de compres i subministraments basant-se en les directrius de les direccions generals; de gestionar, coordinar i administrar els mitjans immobiliaris del Departament; de formar i actualitzar l'inventari del patrimoni mobiliari i immobiliar adscrit al Departament i de presidir la Comissió de Subministraments i la Comissió de Seguiment d'obres del Departament.

L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes té adscrits els tècnics responsables dels projectes constructius del Departament i aglutina tots els projectes d'obres de les diferents unitats del Departament. Entre les seves funcions hi ha les de preparar el pla anual d'obres, d'estudiar i valorar les propostes de reforma, obra nova i manteniment, de supervisar els projectes d'obres adjudicats i validar la seva execució, d'informar sobre els expedients de contractació d'obres i realitzar les recepcions d'obra, i també els informes de disponibilitat de terrenys.

El Servei de Contractacions, Subministraments i Patrimoni s'encarrega d'examinar, analitzar i coordinar les propostes de tramitació d'expedients efectuades per les diferents unitats directives del Departament; controlar el procediment i la formalització de tots els expedients relatius a la contractació d'obres, compres i subministrament, assistència tècnica, serveis i professionals que són competència del Departament; estudiar i preparar la tramitació dels expedients d'adquisició a títol onerós o lucratiu, cessions, permutes o arrendaments de béns immobles; portar inventari del béns immobles adscrits al Departament.

El Servei de Contractacions, Subministraments i Patrimoni s'organitza en tres seccions: la de Contractació, la de Patrimoni i la de Compres i Subministraments.

- La Secció de Contractació té les funcions següents: tramitar els expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments, assistència tècnica, serveis i treballs específics; supervisar els expedients que donin lloc a la signatura de convenis, que impliquin despesa, i participar en les Meses de Contractació i en la Comissió de Subministraments.
- La Secció de Patrimoni té les funcions d'estudiar i preparar la tramitació dels expedients d'adquisició a títol onerós o lucratiu, cessions, permutes o arrendaments de béns immobles que afectin el Departament; proposar les normes per a l'ús correcte del patrimoni i supervisar el seu compliment; portar l'inventari de tots els béns immobles adscrits al Departament i gestionar l'inventari dels béns mobles.
- La Secció de Compres i Subministraments proposa criteris per definir la política

de compres del Departament i la redacció dels programes; gestiona les compres i subministraments per als serveis centrals i d'altres que no siguin assumides per les direccions generals; coordina, assessora i supervisa les activitats de compra i subministrament de les unitats que per a cada Direcció General tinguin especialment delegada aquesta funció i porta la secretaria de la Comissió de Subministraments del Departament.

La Secció de Coordinació i Administració de Projectes depèn de la SGOP i d'ella depèn el Negociat de Control de Costos amb les funcions de donar suport tècnic a les diferents seccions de projectes d'obres del Departament i fer el seguiment de la normativa específica; controlar els components de costos dels projectes d'obra tant si són propis com si han estat encarregats a facultatius externs al Departament i analitzar i justificar les desviacions de les diferents partides de cost dels projectes i de l'execució d'obres.

1.2.2. Normativa reguladora

Les principals disposicions legals i normativa en general que s'han de tenir en compte a l'hora d'analitzar les despeses en Inversions reals del Departament de Justícia, classificades cronològicament, són les següents:

- Decret 3854/1970, de 31 de desembre, en el qual s'aproven els plecs de clàusules administratives generals per a la contractació d'obres de l'Estat.
- Decret 3410/1975, de 25 de novembre, d'aprovació del Reglament general de contractació de l'Estat.
- Decret 22/1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia.
- Ordre de 18 de maig de 1989, de desplegament del Decret 22/1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia.
- Llei 6/1990, de 16 de març, dels censos.
- Decret 161/1990, de 28 de maig, de modificació de l'estructura de la Secretaria General del Departament de Justícia.
- Ordre de 12 de setembre de 1990, de creació de dos negociats a la Secretaria General del Departament de Justícia.
- Ordre de 4 de febrer de 1993, d'implantació en l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'un sistema d'informació comptable de l'actiu fix no financer.
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

- Decret 313/1993, de 24 de novembre, sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments dins l'Administració de la Generalitat.
- Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l'u per cent cultural.
- Ordre de 27 de gener de 1995, de desplegament i execució del Decret 313/1993, de 24 de novembre, sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments dins l'Administració de la Generalitat.
- Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les Administracions públiques.
- Reial decret 390/1996, d'1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei 13/1995 de contractes de les Administracions públiques.
- Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
- Llei 19/1996, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1997.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

2. DESPESES PER INVERSIONS REALS

2.1. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

El pressupost de despeses per Inversions reals aprovat inicialment, classificat per serveis, i les seves modificacions posteriors, en els exercicis 1996 i 1997, ha estat el següent:

Servei	1996			1997		
	Crèdit inicial	Modificacions	Crèdit definitiu	Crèdit inicial	Modificacions	Crèdit definitiu
Gabinet del conseller i Secretaria General	148	81	229	1.331	(300)	1.031
DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil	36	6	42	7	50	57
DG de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació	436	104	540	140	333	473
DG de Relacions amb l'Administració de Justícia	1.889	256	2.145	2.449	967	3.416
DG d'Atenció a la Infància	184	65	249	265	(221)	44
Total	2.693	512	3.205	4.192	829	5.021

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

Hom pot observar l'augment dels crèdits inicials entre 1996 i 1997. Posteriorment aquesta diferència ha estat ampliada en els crèdits definitius per les modificacions de crèdit.

Respecte als crèdits inicials, l'increment s'ha produït, entre altres raons, en pressupostar per a 1997 un total de 953 MPTA per obres de reforma i adequació d'edificis (18 MPTA per a 1996) i perquè les anualitats de 1997 dels expedients plurianuals superaven en 340 MPTA, les de 1996.

L'anàlisi per tipus de les modificacions de crèdit, en l'exercici 1997, és el següent:

Tipus de modificacions	Import
Generats per ingressos	179
Romanents incorporats	1.310
Transferències netes	(660)
Total	829

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

Els crèdits generats per ingressos provenen dels compromisos contrets pel Ministeri de Justícia amb la signatura, el 5 de maig de 1993, d'un conveni de cooperació amb el Departament de Justícia per a la construcció de diversos edificis judicials, i per l'acord d'ampliació del traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Reial decret 966/1990, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de Justícia.

Els romanents incorporats pels diferents serveis pressupostaris són els següents:

Servei	Import
Gabinet del conseller i Secretaria General	75
DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil	31
DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació	179
DG de Relacions amb l'Administració de Justícia	1.023
DG d'Atenció a la Infància	2
Total	1.310

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

La major part dels romanents incorporats de la DG de Relacions amb l'Administració de Justícia corresponen a l'article 61 per a la construcció i reforma d'edificis.

Les transferències de crèdit es corresponen amb 382 MPTA d'altres i 1.042 MPTA de baixes. Entre les altes destaquen 100 MPTA destinats a Inversions en terrenys de la DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació. Respecte a les baixes, les més importants s'han produït en el Gabinet del conseller i Secretaria General, 536 MPTA, en l'aplicació d'Inversions en edificis i altres construccions, de les quals destaquem 320 MPTA destinats a dotar crèdit per a despeses de personal i per a compres de béns i serveis per a la reestructuració de la DG de Relacions amb l'Administració de Justícia i de la DG d'Atenció a la Infància.

2.2. OBLIGACIONS RECONEGUDES

2.2.1. Aspectes generals

L'evolució dels crèdits definitius i de les obligacions reconegudes en els exercicis 1996 i 1997, per serveis, es presenta en el quadre següent:

Servei	1996		1997	
	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes
Gabinet del conseller i Secretaria General	229	153	1.031	457
DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil	42	11	57	34
DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació	540	361	473	373
DG de Relacions amb l'Administració de Justícia	2.145	1.119	3.416	2.533
DG d'Atenció a la Infància	249	246	44	6
Total	3.205	1.890	5.021	3.403

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

L'increment total de les obligacions reconegudes entre 1996 i 1997 ha estat del

80%, i el grau d'execució pressupostària ha passat de 59% a 68%. Aquestes diferències són produïdes bàsicament per la incorporació dels romanents de crèdit d'un exercici a l'altre. De 1996 es van traspasar 1.310 MPTA com a romanents de crèdit al pressupost de 1997, 41% del total de crèdits definitius de 1996. En 1997 han quedat pendents d'utilitzar un total de 1.618 MPTA de crèdit definitiu, dels quals s'ha sol·licitat que 1.547 MPTA siguin incorporats a l'exercici 1998.

El resum de les obligacions reconegudes en 1997 en el capítol Inversions reals, per articles pressupostaris, és el següent:

Servei	Inversions en terrenys i béns naturals	Inversions en edificis i altres construccions	Inversions en maquinària instal·lacions i utilitatge	Inversions en material de transport	Inversions en mobiliari i estris	Inversions en equips de procés de dades	Total
Gabinet del conseller i Secretaria General	-	290	-	14	13	140	457
DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil	-	27	4	-	3	-	34
DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació	87	190	81	-	15	-	373
DG de Relacions amb l'Administració de Justícia	-	2.183	101	-	249	-	2.533
DG d'Atenció a la Infància	-	2	2	-	2	-	6
Total	87	2.692	188	14	282	140	3.403

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

Hom pot observar que la major part de les despeses les concentra la DG de Relacions amb l'Administració de Justícia en l'article 61 d'Inversions en edificis i altres construccions. Les funcions principals d'aquesta DG és la col·laboració en l'organització i l'execució de les activitats dirigides a proveir els òrgans jurisdiccionals radicats a Catalunya, dels mitjans necessaris per al desenvolupament de la seva funció amb independència i eficàcia.

2.2.2. Inversions en terrenys i béns naturals

El detall de les despeses per inversions en terrenys i béns naturals durant l'exercici 1997, classificat per serveis, és el següent:

Servei	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes
DG de Relacions Penitenciàries i Rehabilitació	150	87

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

L'import de les obligacions reconegudes correspon a les indemnitzacions relacionades amb l'expropiació d'unes finques afectades pel Pla Especial d'Equipament Penitenciari de Quatre Camins, en compliment de diferents

sentències de la Sala tercera contenciosa administrativa del Tribunal Suprem produïdes durant l'exercici 1996.

Les sentències han establert el dret dels afectats per l'expropiació a ser indemnitzats amb l'import del valor dels terrenys expropiats fixat pel Tribunal Suprem, 32 MPTA, més 10 MPTA en concepte de danys i perjudicis ocasionats i 45 MPTA per interessos legals meritats des de la data de l'ocupació dels terrenys per la Generalitat de Catalunya, 16 de juliol de 1986, fins al moment de l'efectiu pagament.

2.2.3. Inversions en edificis i altres construccions

El detall de les despeses per inversions en edificis i altres construccions durant l'exercici 1997, classificat per serveis, és el següent:

Servei	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes
Gabinet del conseller i Secretaria General	464	290
DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil	46	27
DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació	247	190
DG de Relacions amb l'Administració de Justícia	2.739	2.183
DG d'Atenció a la Infància	29	2
Total	3.525	2.692

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

- Les obligacions reconegudes en el servei del Gabinet del conseller i Secretaria General inclouen, com a part més significativa, els imports liquidats per les quotes de dos censos emfitèutics constituïts durant aquest exercici per a l'adquisició de dos edificis:
 - Edifici del carrer Aragó 332. El 28 de febrer de 1997 es va escripturar la compravenda d'aquest edifici, propietat de Allianz-Ras Seguros y Reaseguros, SA, a favor de la Generalitat de Catalunya, per un import de 1.475 MPTA. A continuació, en la mateixa data, la Generalitat de Catalunya, ja propietària de l'edifici, va constituir un cens emfitèutic de caràcter perpetu i redimible a vint anys, modalitat de revessejats, a favor del Banco Sanpaolo, SA. En virtut d'aquest cens, la Generalitat va rebre del banc 1.578 MPTA, corresponents als 1.475 MPTA de la compravenda inicial i als 103 MPTA de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, a canvi de l'obligació de pagament d'una renda anual de 141 MPTA, a liquidar mensualment i actualitzable cada any.
 - Edifici del carrer Roger de Flor 62-68. En una operació similar a l'anterior, el 25 de març de 1997 es va escripturar la compravenda d'aquest edifici, propietat de Corporación Sodepro, SL a favor de la Generalitat de Catalunya, per un import de 1.025 MPTA. En la mateixa data, la Generalitat de Catalunya va constituir un

cens emfitèutic de caràcter perpetu i redimible a vint anys, modalitat de revessejats, a favor del Banco de Vitoria, SA. La Generalitat va rebre del banc 1.097 MPTA, corresponents als 1.025 MPTA de la compravenda inicial i als 72 MPTA de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, a canvi de l'obligació de pagament d'una renda anual de 96 MPTA, a liquidar mensualment i actualitzable cada any.

- La DG de Relacions amb l'Administració de Justícia recull el 81% del total de les obligacions reconegudes d'aquest article. Els imports més significatius corresponen a quatre actuacions d'abast plurianual: la reforma del Palau de Justícia de Barcelona i la construcció dels nous edificis judicials de Reus, Mataró i l'Escola Judicial.

Aquests quatre projectes han estat autoritzats per Acord de Govern amb les anualitats següents:

Projectes	1995	1996	1997	1998	Total
Palau de Justícia de Barcelona	165,0	400,0	400,0	331,4	1.296,4
Edifici Judicial de Reus	5,0	300,0	395,4	-	700,4
Edifici Judicial de Mataró	5,0	400,0	549,8	-	954,8
Escola Judicial	-	450,0	350,0	-	800,0
Total	165,0	1.550,0	1.695,2	331,4	3.751,6

Imports en milions de pessetes.

Font: Elaboració pròpia.

Tot seguit detallem les característiques més significatives dels expedients corresponents a aquestes actuacions:

PROJECTES	SISTEMA D'ADJUDICACIÓ	PRESSUPOST DE LICITACIÓ	ADJUDICATARI	DATA D'ADJUDICACIÓ	PREU D'ADJUDICACIÓ	% COEFICIENT DE BAIXA
Palau de Justícia de Barcelona	Concurs Públic	1.143	Palau de Justícia UTE	17.10.1995	886	22,5
Modificació	-	-	Palau de Justícia UTE	21.07.1997	85	-
TOTAL					971	
Edifici Judicial de Reus	Concurs Públic	593	Obras y Servicios Hispania, SA	27.12.1995	513	13,5
Modificació	-	-	Obras y Servicios Hispania, SA	16.07.1997	87	-
TOTAL					600	
Edifici Judicial de Mataró	Concurs Públic	788	COMAPA, SA	27.12.1995	658	16,52
Modificació	-	-	COMAPA, SA	29.02.1996	55	-
TOTAL					713	
Escola Judicial Fase I	Concurs Públic	575	PACSA	10.05.1996	474	17,788
Fase I Complementari	Procediment negociat	-	PACSA	07.02.1997	94	-
Escola Judicial Fase II	Concurs Públic	259	PACSA	18.07.1996	220	15,2423
Fase II Complementari	Procediment negociat	-	PACSA	29.01.1997	42	-
TOTAL					830	
TOTAL GENERAL					3.114	

Imports en milions de pessetes.

Font: Elaboració pròpia.

Les certificacions i liquidacions d'obres efectuades durant l'exercici 1997 en aquestes actuacions es resumeixen en el quadre següent:

Obres	Total
Palau de Justícia de Barcelona	554,8
Edifici Judicial de Reus	344,2
Edifici Judicial de Mataró	457,5
Escola Judicial	516,4
Total	1.872,9

Imports en milions de pessetes.

Font: Elaboració pròpia.

Com es pot observar, en les obres del Palau de Justícia i de l'Escola Judicial els imports certificats superen els imports autoritzats per Acord de Govern.

En el cas del Palau de Justícia, el principal motiu de l'excés ha estat la modificació del contracte efectuada el juliol de 1997. L'import de la modificació va ser de 85 MPTA i es fonamentava en la redistribució de l'espai de diverses sales motivada per l'aplicació de la Llei del Codi Penal i per noves necessitats.

Pel que fa a l'Escola Judicial el motiu va ser la realització de dos contractes complementaris amb uns imports certificats de 104 MPTA i 46 MPTA respectivament, per a la rehabilitació i per al muntatge de les instal·lacions.

Els imports que finalment s'han reconegut en 1997 els resumim en el quadre següent:

Obres	Certificacions 1996 (1)	Certificacions 1997	Total
Palau de Justícia de Barcelona	22,9	292,9	315,8
Edifici Judicial de Reus	250,8	0,0	250,8
Edifici Judicial de Mataró (2)	128,2	386,2	514,4
Escola Judicial (2)	350,4	503,0	853,4
Total	752,3	1.182,1	1.934,4

Imports en milions de pessetes.

Font: Elaboració pròpia.

Notes: (1) Amb crèdit incorporat al 1997.

(2) Aquests imports inclouen les liquidacions.

Hom pot observar que els imports reconeguts no coincideixen amb els imports certificats ja que algunes de les certificacions efectuades han restat pendents de registre. Els imports pendents són els següents:

Obres	Imports
Palau de Justícia de Barcelona	261,9
Edifici Judicial de Reus	344,2
Edifici Judicial de Mataró	71,3
Escola Judicial	13,4
Total	690,8

Imports en milions de pessetes.

Font: Elaboració pròpia.

De l'import total s'ha sol·licitat la incorporació de 516 MPTA del crèdit a l'exercici 1998. Els 175 MPTA restants s'hauran de reconèixer amb càrrec al crèdit dotat per a l'exercici 1998.

A continuació presentem un quadre resum, per projectes, de les dades econòmiques comentades anteriorment:

Projectes	Import adjudicat i modificacions	Registrat fins a 1996	Registrat 1997		No registrat	Total certificat 1997	Liquidacions 1998	Total projecte
			Certificat 1996	Certificat 1997	Certificat 1997			
Palau de Justícia de Barcelona	971,0	393,3	22,9	292,9	261,9	554,8	96,9	1.067,9
Edifici Jutjats de Reus	600,0	5,0	250,8	0,0	344,2	344,2	60,0	660,0
Edifici Jutjats de Mataró	713,5	199,0	128,2	386,2	71,3	457,5	0,0	784,7
Escola Judicial	829,5	49,1	350,4	503,0	13,4	516,4	0,0	915,9
TOTAL	3.114,0	646,4	752,3	1.182,1	690,8	1.872,9	156,9	3.428,5

Imports en milions de pessetes.

Font: Elaboració pròpia.

Les modificacions en els contractes per tal d'ampliar o millorar les instal·lacions no han superat el límit del 10%.

2.2.4. Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge

El detall de les despeses per inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge, classificat per serveis, és el següent:

Servei	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes
DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil	6	4
DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació	111	81
DG de Relacions amb l'Administració de Justícia	260	101
DG d'Atenció a la Infància	8	2
Total	385	188

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

- La DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació presenta el 43% del total de les obligacions reconegudes en aquest article. Entre el gran nombre d'expedients recollits en aquestes partides pressupostàries destaca el corresponent a les obres complementàries del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del centre penitenciari d'homes de Barcelona, per 20,2 MPTA, efectuades per SOCLESA. La certificació d'aquestes obres data del novembre de 1996, però el crèdit va ser incorporat al pressupost de 1997, on finalment s'ha reconegut l'obligació.

La certificació de les obres es va efectuar el novembre de 1996 i s'ha comptabilitzat en l'exercici 1997 en una partida dotada amb crèdit provinent de romanents d'exercicis anteriors.

- La DG de Relacions amb l'Administració de Justícia recull un 54% del total de les obligacions reconegudes. Tal com succeeix amb l'anterior DG, les partides inclouen un gran nombre de documents comptables, dels quals els més importants són dos documents que sumen un total de 16 MPTA i que corresponen a part de les despeses per al subministrament de terminals de marcatge, programari i fitxes de manteniment dels mitjans per al control de presència horària de funcionaris de l'Administració de Justícia. Aquest contracte es va adjudicar mitjançant concurs a l'empresa SPEC, SA per un import màxim de 27 MPTA.

2.2.5. Inversions en material de transport

El detall de les despeses per inversions en material de transport durant l'exercici 1997, classificat per serveis, és el següent:

Servei	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes
Gabinet del Conseller i Secretaria General	27	14

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

En aquest article trobem la compra de cinc automòbils a Citroën Hispania, SA, destinats a diversos serveis del departament: un al Centre Penitenciari de Can

Brians, dos a la DG d'Atenció a la Infància, un al Centre Educatiu Montilivi i un a la DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil.

2.2.6. Inversions en mobiliari i estris

El detall de les despeses per inversions en mobiliari i estris, classificat per serveis, és el següent:

Servei	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes
Gabinet del conseller i Secretaria General	20	13
DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil	5	3
DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació	15	15
DG de Relacions amb l'Administració de Justícia	367	249
DG d'Atenció a la Infància	7	2
Total	414	282

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

La DG de Relacions amb l'Administració de Justícia ha registrat un 88% del total de les obligacions reconegudes en aquest article.

Part d'aquestes inversions en mobiliari i estris estan relacionades amb els edificis que s'estaven construint (vegeu apartat 2.2.3). Els Acords de Govern d'autorització de despeses plurianuals per a la construcció d'aquells edificis incloïen els imports per inversions en mobiliari i estris següents:

Projectes	1996	1997	1998	Total
Palau de Justícia de Barcelona	50	75	25	150
Edifici Judicial de Reus	-	79	-	79
Edifici Judicial de Mataró	-	91	-	91
Total	50	245	25	320

Imports en milions de pessetes.

Font: Elaboració pròpia.

Durant 1997 els 249 MPTA de les obligacions reconegudes per la DG de Relacions amb l'Administració de Justícia en inversió en mobiliari i estris inclouen 33 MPTA per al Palau de Justícia de Barcelona, i 66 MPTA per a l'edifici judicial de Mataró. En cap dels dos casos no s'han sobrepassat els imports de l'anualitat aprovada.

També hi ha una sèrie d'expedients d'aquestes inversions pels quals no s'han reconegut obligacions en 1997, incorporant el crèdit al 1998, encara que les dates de recepció dels béns són anteriors al tancament de 1997. Aquests expedients corresponen al Palau de Justícia de Barcelona, 25 MPTA; a l'Edifici Judicial de Reus, 54 MPTA i a l'Edifici Judicial de Mataró 9 MPTA.

Cal esmentar que entre els 249 MPTA de les obligacions reconegudes per la DG de Relacions amb l'Administració de Justícia hi ha imports corresponents a l'Escola Judicial, però que no tenien la consideració de despeses plurianuals.

Els principals proveïdors de mobiliari i estris de la DG de Relacions amb l'Administració de Justícia durant 1997 han estat els següents:

Proveïdor	Import
Comercial Contel, SA	115
Comercial Prous, SA	22
Figueras Inter. Seating, SA	22
Eypar, SA	15
Seuba, SA	15
Fri-tel, SL	14
BCN 2, SL	14
Kortilux, SA	7
Altres	25
Total	249

Imports en milions de pessetes.

Font: Elaboració pròpia.

2.2.7. Inversions en equips de procés de dades

El detall de les despeses per inversions en equips de procés de dades durant l'exercici 1997, classificat per serveis, és el següent:

Servei	Crèdit definitiu	Obligacions reconegudes
Gabinet del Conseller i Secretaria General	520	140

Imports en milions de pessetes.

Font: Servei de Gestió Econòmica.

Tal com succeeix amb les compres d'elements de transport, les despeses per inversió en equips de procés de dades durant 1997 també han estat centralitzades des del Gabinet del Conseller i Secretaria General. L'adquisició d'aquest material es fa bàsicament per la Comissió Central de Subministrament mitjançant el procediment de béns homologats.

Cal destacar que dels 140 MPTA de les obligacions reconegudes durant 1997, 62 MPTA corresponen a partides dotades de crèdit provinent de romanents de l'exercici 1996, un 44% del total.

Els principals proveïdors d'equips de procés de dades durant 1997 han estat els següents:

Proveïdors	Imports
Olivetti España, SA	39
Algoritmos procesos y diseños, SA	28
El Corte Inglés, SA	14
International Business Machines, SA	12
Hewlett Packard Española, SA	10
CIGESA	9
Fujitsu Sorbus, SA	7
Altres	21
Total	140

Imports en milions de pessetes.

Font: Elaboració pròpia.

3. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ ESTABLERT

La finalitat del treball realitzat és analitzar el tractament pressupostari, el control intern, el compliment de la normativa aplicable, en definitiva, els procediments de gestió emprats, tant en el seu disseny com en el seu funcionament efectiu.

Hem concentrat la revisió en els expedients d'obres i els expedients de subministrament de béns homologats que suposen aproximadament un 70% de l'import total del capítol 6 de despeses Inversions reals.

Els contractes analitzats han estat adjudicats durant o després de l'any 1995, per la qual cosa ja estava en vigor la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques (LCAP).

3.1. CONTRACTES D'OBRES

Podem dividir el procediment de la contractació d'obres en diferents fases:

- Actuacions preparatòries
- Adjudicació
- Formalització del contracte
- Adjudicació i finalització de les obres
- Modificació de contracte

3.1.1. Actuacions preparatòries

Aquesta fase agrupa les actuacions des que s'inicien amb l'elaboració dels projectes fins a la publicació dels procediments per a l'adjudicació dels

contractes. Els documents i procediments administratius més importants que hem analitzat són els següents:

- Projecte. Verificació del contingut: memòria, plànols de conjunt i de detall, plec de prescripcions tècniques particulars, pressupostos, programa de desenvolupament del treball i estudi geotècnic dels terrenys (si és compatible amb l'obra), etc.
- Informe de les oficines o unitats de supervisió de projectes.
- Aprovació tècnica del projecte.
- Acta de replanteig previ de l'obra, per comprovar la realitat geomètrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys, necessaris per a la seva execució.
- Resolució d'incoació de l'expedient, autoritzant l'inici de l'expedient i establint-se la forma de contractació i el procediment a seguir.
- Plec de clàusules administratives particulars.
- Informe de l'Assessoria jurídica.
- Certificació d'existència de crèdit pressupostari del Servei de Gestió Econòmica.
- Informe de la Intervenció Delegada.
- Acord de Govern en el cas que el període d'execució del contracte sigui superior a l'any.
- Resolució d'aprovació de l'expedient de contractació de la Secretaria General i obertura del procediment d'adjudicació. En aquest moment es genera el document comptable d'aprovació de la despesa.
- Publicació de l'anunci dels procediments per a l'adjudicació dels contractes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Quan l'import del pressupost sigui igual o superior a 799,8 MPTA (sense IVA i per al període 1996-1997), s'haurà de publicar també en el Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE). Ara bé, si per raó d'import no s'hagués de publicar en el DOCE, es pot substituir la publicació en el BOE per la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

3.1.2. Adjudicació

En la fase d'adjudicació recollim les actuacions administratives des del moment en què es reben les ofertes fins al moment de publicació de l'adjudicació.

La forma de selecció del contractista utilitzada en els expedients revisats ha estat el concurs obert, a excepció de dos contractes complementaris d'un dels expedients d'obres, que s'han fet per procediment negociat.

Els documents i procediments administratius més importants que hem revisat en aquesta fase són els següents:

- Certificació de la relació de proposicions presentades.
- Acta de la mesa de contractació proposant l'adjudicació del contracte.
- Resolució d'adjudicació definitiva per part de l'òrgan competent, el secretari general per delegació (Ordre del Conseller de Justícia de 7.03.94). En aquest moment s'elabora el document comptable de disposició de la despesa.
- Notificació de l'adjudicació als participants de la licitació, per correu certificat.
- Publicació de l'adjudicació definitiva. Si l'import és superior a 5 MPTA es pot publicar en el BOE o en el DOGC, si l'import és superior a 799,8 MPTA (sense IVA i per al període 1996-1997) és obligatòria la publicació en el DOCE i també en aquest cas s'exigeix la publicació en el BOE.

3.1.3. Formalització del contracte

En aquesta fase hem analitzat la formalització i signatura del contracte i altres obligacions administratives:

- Formalització i signatura del contracte per les parts, dins el termini de 30 dies a comptar des del dia següent al de la notificació d'adjudicació.
- Tramesa per part de la SG a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les dades relatives als contractes adjudicats pels òrgans de contractació del departament, per a la seva inscripció en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

3.1.4. Execució i finalització de les obres

En la fase d'execució i finalització de les obres hem analitzat la documentació existent des de l'acta de comprovació del replanteig fins a la liquidació definitiva.

- Acta de comprovació del replanteig de l'arquitecte director de l'obra i del contractista.
- Certificacions d'obres i documents comptables de reconeixement d'obligacions

i ordenació del pagament.

- Acta de recepció provisional.
- Liquidació provisional.
- Acta de recepció definitiva.
- Devolució de la fiança.

3.1.5. Modificació de contracte

Quan s'ha considerat necessària, s'ha autoritzat una modificació del projecte per part de l'òrgan de contractació. Els documents i procediments administratius més importants verificats en aquests casos han estat:

- Proposta de modificació, elaborada pels arquitectes de la Subdirecció d'Obres i Patrimoni.
- Redacció del projecte a càrrec del director facultatiu de l'obra.
- Audiència del contractista per tal de fer-li conèixer les modificacions a introduir en el projecte.
- Aprovació tècnica del projecte modificat a càrrec del secretari general.
- Resolució d'incoació d'expedient de modificació.
- Informe de l'Assessoria Jurídica.
- Certificat del Servei de Pressupostos sobre l'existència de crèdit pressupostari.
- Informe de la Intervenció Delegada.
- Resolució d'aprovació de l'expedient de modificació de la Secretaria General.
- Contracte de Modificació. Document complementari del contracte inicial on es recullen les modificacions fetes en el projecte d'obra.

3.2. CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DE BÉNS HOMOLOGATS

Hem seleccionat una sèrie d'expedients realitzats per a l'adquisició de béns tipus homologats per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat.

En els expedients revisats hem verificat els següents tràmits:

- Justificació de la necessitat del subministrament.
- Acord d'autorització de la Comissió de Subministraments del Departament.
- Certificat d'existència de crèdit.
- Fiscalització prèvia de la Intervenció Delegada.
- Resolució d'aprovació del subministrament i de la despesa dictada per l'òrgan de contractació competent.
- Notificació de la resolució d'adquisició al subministrador homologat seleccionat.
- Factura conformada pel subdirector general d'obres i patrimoni.
- Certificat de recepció del material, d'acord amb les prescripcions del catàleg.

4. OBRES FISCALITZADES

A continuació detallem les característiques més significatives de les obres fiscalitzades.

4.1. EDIFICI PALAU DE JUSTÍCIA

Actuacions preparatòries

Acord de Govern

Data:	25.7.95
Anualitats:	1995: 165.000.000 PTA
	1996: 450.000.000 PTA
	1997: 475.000.000 PTA
	1998: 356.422.347 PTA

Projecte

Data: 26.7.95
 Signant: Responsable àrea de Projectes i Obres de nova construcció
 Pressupost d'execució material: 828.162.005 PTA
 Despeses generals (13%): 107.661.061 PTA
 Benefici industrial (6%): 49.689.720 PTA
 IVA: 157.682.046 PTA
 Pressupost de contracte: 1.143.194.832 PTA
 Forma d'adjudicació: Concurs
 Procediment d'adjudicació: Obert

Informe tècnic de supervisió

Data: 26.7.95
 Signant: Oficina de projectes i obres

Aprovació tècnica del projecte

Data: 27.7.95
 Signant: Secretari general
 Pressupost de contracte: 1.143.194.832 PTA
 Anualitats: 1995/1996/1997/1998
 Termini d'execució: 33 mesos
 Forma d'adjudicació: Concurs
 Procediment d'adjudicació: Obert

Acta de replanteig previ

Data: 28.7.95
 Signant: Arquitecte de l'Oficina de Projectes i Obres

Resolució d'incoació de l'expedient

Data: 31.7.95
 Signant: Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules

Data: 31.7.95
 Signant: Cap del Servei d'Assessoria Jurídica

Informe fiscal

Data: 1.8.95
 Signant: Interventor delegat
 Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
 Import: 1.143.194.832 PTA
 Anualitats: 1995/1996/1997/1998

Resolució d'aprovació de l'expedient

Data:	2.8.95
Signant:	Secretari general
Import:	1.143.194.832 PTA
Forma d'adjudicació:	Concurs
Procediment d'adjudicació:	Obert

Publicació

Diari:	DOGC/BOE/DOCE
Data publicació:	14.8.95/2.9.95/8.8.95

Ofertes i proposicions

Nombre d'ofertes presentades:	18 licitadors
Oferta més elevada:	1.116.901.350 PTA
Oferta més baixa:	742.813.000 PTA

Resolució d'adjudicació

Data:	17.10.95
Signant:	Secretari general
Import d'adjudicació:	885.975.995 PTA
Coeficient de baixa:	0,225
Adjudicatari:	UTE FOCCSA-OSHSA

Comunicació a l'adjudicatari

Data:	18.10.95
-------	----------

Fiança

Import:	45.727.793 PTA
Data:	27.10.95/22.11.95

Redacció i signatura del contracte

Data:	17.11.95
Signants:	Secretari general Representant UTE FOCCSA-OSHSA
Import del contracte:	885.975.995 PTA

Publicació de l'adjudicació

Diari:	DOGC
Data publicació:	3.1.96

Acta d'inspecció prèvia

Data:	25.9.96
-------	---------

Modificació de contracte

Informe proposta de la modificació

Data: 1.7.97
 Signant: Arquitecte de l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes
 Import de la modificació: 84.997.514 PTA

Tràmit d'audiència

Data: 1.7.97

Aprovació tècnica del projecte

Data: 2.7.96
 Signant: Secretari general
 Pressupost de contracte: 84.997.514 PTA
 Anualitats: 1997

Resolució d'incoació de l'expedient

Data: 7.7.97
 Signant: Secretari general

Informe jurídic

Data: 11.7.97
 Signant: Cap de l'Assessoria Jurídica

Informe fiscal

Data: 17.7.97
 Signant: Interventor delegat
 Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
 Import: 84.997.514 PTA
 Anualitat: 1997

Resolució aprovació modificació

Data: 21.7.97
 Signant: Secretari general
 Import: 84.997.514 PTA

Modificació del contracte

Data: 25.7.97
 Signants: Secretari general
 Representant UTE FOCCSA-OSHSA
 Import: 84.997.514 PTA

Fiança complementària

Import: En la modificació de contracte
s'indica que no cal aportar fiança
complementària

Data: 20.3.96

Liquidació

Acta de recepció

Data: 18.5.98

Expedient de liquidació

Data: 25.5.98

Signant: Arquitecte director de les obres

Import: 96.940.048 PTA

Resolució d'aprovació de la liquidació

Data: 25.5.98

Signant: Secretari general

Import: 96.940.048 PTA

4.2. EDIFICI JUDICIAL DE REUS

Actuacions preparatòries

Acord de Govern

Data: 7.11.95

Anualitats: 1995: 5.000.000 PTA
1996: 300.000.000 PTA
1997: 474.399.572 PTA

Projecte

Data: 24.11.95

Signant: Responsable àrea de Projectes i
Obres de nova construcció

Pressupost d'execució material: 429.602.441 PTA

Despeses generals (13%): 55.848.317 PTA

Benefici industrial (6%): 25.776.146 PTA

IVA: 81.796.305 PTA

Pressupost de contracte: 593.023.210 PTA

Forma d'adjudicació: Concurs

Procediment d'adjudicació: Obert

Informe tècnic de supervisió

Data: 24.11.95

Signant: Oficina de projectes i obres

Aprovació tècnica del projecte

Data:	24.11.95
Signant:	Secretari general
Pressupost de contracte:	593.023.210 PTA
Anualitats:	1995/1996/1997
Termini d'execució:	14 mesos
Forma d'adjudicació:	Concurs
Procediment d'adjudicació:	Obert

Acta de replanteig previ

Data:	27.11.95
Signant:	Arquitecte de l'Oficina de Projectes i Obres

Resolució d'incoació de l'expedient

Data:	28.11.95
Signant:	Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules

Data:	29.11.95
Signant:	Cap del Servei d'Assessoria Jurídica

Informe fiscal

Data:	30.11.95
Signant:	Interventor delegat
Aplicació pressupostària:	12.05.610.02
Import:	593.023.210 PTA
Anualitats:	1995/1996/1997

Resolució d'aprovació de l'expedient

Data:	1.12.95
Signant:	Secretari general
Import:	593.023.210 PTA
Forma d'adjudicació:	Concurs
Procediment d'adjudicació:	Obert

Publicació

Diari:	DOGC
Data publicació:	4.12.95

Ofertes i proposicions

Nombre d'ofertes presentades:	19 licitadors
Oferta més elevada:	587.092.978 PTA
Oferta més baixa:	441.780.423 PTA

Resolució d'adjudicació

Data: 27.12.95
 Signant: Secretari general
 Import d'adjudicació: 512.965.077 PTA
 Coeficient de baixa: 0,135
 Adjudicatari: Obras y Servicios Hispania, SA

Comunicació a l'adjudicatari

Data: 29.12.95

Redacció i signatura del contracte

Data: 29.12.95
 Signants: Secretari general
 Representant d'OSHS
 Import del contracte: 512.965.077 PTA

Fiança

Import: 23.720.928 PTA
 Data: 28.12.95

Publicació de l'adjudicació

Diari: DOGC
 Data publicació: 26.2.96

Comprovació del replanteig

Data: 17.5.96

Modificació de contracte

Informe proposta de la modificació

Data: 1.7.97
 Signant: Arquitecte de l'Oficina Tècnica
 d'Obres i Projectes
 Import de la modificació: 87.034.923 PTA

Tràmit d'audiència

Data: 10.7.97

Aprovació tècnica del projecte

Data: 16.7.97
 Signant: Secretari general
 Pressupost de contracte: 87.034.923 PTA
 Anualitats: 1997
 Termini d'execució: 12 mesos

Resolució d'incoació de l'expedient

Data: 16.7.97
Signant: Secretari general

Informe jurídic

Data: 21.7.97
Signant: Cap de l'Assessoria Jurídica

Informe fiscal

Data: 23.7.97
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 87.034.923 PTA
Anualitat: 1997

Resolució aprovació modificació

Data: 28.7.97
Signant: Secretari general
Import: 87.034.923 PTA

Modificació del contracte

Data: 12.8.97
Signants: Secretari general
Representant d'OSHSA
Import: 87.034.923 PTA

Fiança complementària

Import: 279.072 PTA
Data: 12.8.97

Liquidació

Acta de recepció

Data: 12.1.98

Expedient de liquidació

Data: 30.3.98
Signant: Arquitecte director de les obres
Import: 59.999.346 PTA

Resolució d'aprovació de la liquidació

Data: 30.3.98
Signant: Secretari general
Import: 59.999.346 PTA

4.3. EDIFICI JUDICIAL DE MATARÓ**Actuacions preparatòries**Acord de Govern

Data: 7.11.95
 Anualitats: 1995: 5.000.000 PTA
 1996: 400.000.000 PTA
 1997: 640.840.499 PTA

Projecte

Data: 23.11.95
 Signant: Responsable àrea de Projectes i Obres de nova construcció
 Pressupost d'execució material: 571.315.502 PTA
 Despeses generals (13%): 74.271.015 PTA
 Benefici industrial (6%): 34.278.930 PTA
 IVA: 108.778.471 PTA
 Pressupost de contracte: 788.643.919 PTA
 Forma d'adjudicació: Concurs
 Procediment d'adjudicació: Obert

Informe tècnic de supervisió

Data: 24.11.95
 Signant: Oficina de projectes i obres

Aprovació tècnica del projecte

Data: 24.11.95
 Signant: Secretari general
 Pressupost de contracte: 788.643.919 PTA
 Anualitats: 1995/1996/1997
 Termini d'execució: 18 mesos
 Forma d'adjudicació: Concurs
 Procediment d'adjudicació: Obert

Acta de replanteig previ

Data: 27.11.95
 Signant: Arquitecte de l'Oficina de Projectes i Obres

Resolució d'incoació de l'expedient

Data: 28.11.95
 Signant: Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules

Data: 29.11.95
Signant: Cap del Servei d'Assessoria Jurídica

Informe fiscal

Data: 30.11.95
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 788.643.919 PTA
Anualitats: 1995/1996/1997

Resolució d'aprovació de l'expedient

Data: 1.12.95
Signant: Secretari general
Import: 788.643.919 PTA
Forma d'adjudicació: Concurs
Procediment d'adjudicació: Obert

Publicació

Diari: DOGC
Data publicació: 4.12.95

Ofertes i proposicions

Nombre d'ofertes presentades: 20 licitadors
Oferta més elevada: 785.016.157 PTA
Oferta més baixa: 575.941.501 PTA

Resolució d'adjudicació

Data: 27.12.95
Signant: Secretari general
Import d'adjudicació: 658.359.944 PTA
Coeficient de baixa: 0,165
Adjudicatari: COMAPA, SA

Redacció i signatura del contracte

Data: 28.12.95
Signants: Secretari general
Representant de COMAPA, SA
Import del contracte: 658.359.944 PTA

Comunicació a l'adjudicatari

Data: 29.12.95

Fiança

Import: 31.545.757 PTA
Data: 3.1.96

Publicació de l'adjudicació

Diari: DOGC
Data publicació: 26.2.96

Comprovació del replanteig

Data: 20.3.96

Modificació de contracte

Informe proposta de la modificació

Data: 1.2.96
Signant: Arquitecte de l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes
Import de la modificació: 55.053.400 PTA

Aprovació tècnica del projecte

Data: 28.2.96
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 55.053.400 PTA
Anualitats: 1997
Termini d'execució: 1,5 mesos

Resolució d'incoació de l'expedient

Data: 29.2.96
Signant: Secretari general

Tràmit d'audiència

Data: 5.3.96

Informe jurídic

Data: 6.3.96
Signant: Cap de l'Assessoria Jurídica

Informe fiscal

Data: 7.3.96
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 55.053.400 PTA
Anualitat: 1996

Resolució aprovació modificació

Data: 11.3.96
Signant: Secretari general
Import: 55.053.400 PTA

Modificació del contracte

Data: 20.3.96
 Signants: Secretari general
 Representant de COMAPA, SA
 Import: 55.053.400 PTA

Fiança complementària

Import: 2.202.136 PTA
 Data: 20.3.96

LiquidacióActa de recepció

Data: 29.7.97

Expedient de liquidació

Data: 29.9.97
 Signant: Arquitecte director de les obres
 Import: 71.340.900 PTA

Resolució d'aprovació de la liquidació

Data: 29.9.97
 Signant: Secretari general
 Import: 71.340.900 PTA

4.4. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (FASE I)**Actuacions preparatòries**Projecte

Data: 9.4.96
 Signant: Responsable àrea de Projectes i
 Obres de nova construcció
 Pressupost d'execució material: 416.873.842 PTA
 Despeses generals (13%): 54.193.599 PTA
 Benefici industrial (6%): 25.012.431 PTA
 IVA: 79.372.780 PTA
 Pressupost de contracte: 575.452.652 PTA
 Forma d'adjudicació: Concurs
 Procediment d'adjudicació: Obert

Informe tècnic de supervisió

Data: 9.4.96
 Signant: Oficina de projectes i obres

Aprovació tècnica del projecte

Data:	9.4.96
Signant:	Secretari general
Pressupost de contracte:	575.452.652 MPTA
Anualitats:	1996 / 1997
Termini d'execució:	8 mesos
Forma d'adjudicació:	Concurs
Procediment d'adjudicació:	Obert

Acta de replanteig previ

Data:	10.4.96
Signant:	Arquitecte de l'Oficina de Projectes i Obres

Resolució d'incoació de l'expedient

Data:	12.4.96
Signant:	Secretari general

Acord de Govern

Data:	16.4.96
Anualitats:	1996: 450.000.000 PTA 1997: 350.000.000 PTA

Informe jurídic del plec de clàusules

Data:	16.4.96
Signant:	Cap del Servei d'Assessoria Jurídica

Informe fiscal

Data:	16.4.96
Signant:	Interventor delegat
Aplicació pressupostària:	12.05.610.02
Import:	575.452.652 PTA
Anualitats:	1996/1997

Resolució d'aprovació de l'expedient

Data:	16.4.96
Signant:	Secretari general
Import:	575.452.652 PTA
Forma d'adjudicació:	Concurs
Procediment d'adjudicació:	Obert

Publicació

Diari:	DOGC
Data publicació:	17.4.96

Ofertes i proposicions

Nombre d'ofertes presentades:	11 licitadors
Oferta més elevada:	575.452.652 PTA
Oferta més baixa:	473.885.855 PTA

Resolució d'adjudicació

Data:	10.5.96
Signant:	Secretari general
Import d'adjudicació:	473.885.855 PTA
Coeficient de baixa:	0,1765
Adjudicatari:	PACSA

Comunicació a l'adjudicatari

Data:	10.5.96
-------	---------

Redacció i signatura del contracte

Data:	13.6.96
Signants:	Secretari general Representant PACSA
Import del contracte:	473.885.855 PTA

Fiança

Import:	23.018.106 PTA
Data:	24.5.96

Acta comprovació replanteig

Data:	29.5.96
-------	---------

Publicació de l'adjudicació

Diari:	DOGC
Data publicació:	23.12.96

Liquidació

Acta de recepció

Data:	18.4.97
-------	---------

Expedient de liquidació

Data:	2.6.97
Signant:	Arquitecte director de les obres
Import:	47.382.298 PTA

Resolució d'aprovació de la liquidació

Data: 2.6.97
 Signant: Secretari general
 Import: 47.382.298 PTA

4.5. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (COMPLEMENTARI FASE I)

Actuacions preparatòries

Projecte

Data: 9.1.97
 Signant: Responsable àrea de Projectes i Obres de nova construcció
 Pressupost d'execució material: 68.224.827 PTA
 Despeses generals (13%): 8.869.227 PTA
 Benefici industrial (6%): 4.093.489 PTA
 IVA: 12.990.007 PTA
 Pressupost de contracte: 94.177.550 PTA
 Procediment d'adjudicació: Negociat

Informe tècnic de supervisió

Data: 10.1.97
 Signant: Oficina de projectes i obres

Acta de replanteig previ

Data: 10.1.97
 Signant: Arquitecte de l'Oficina de Projectes i Obres

Aprovació tècnica del projecte

Data: 13.1.97
 Signant: Secretari general
 Pressupost de contracte: 94.177.550 PTA
 Anualitats: 1997
 Termini d'execució: 3 mesos
 Procediment d'adjudicació: Negociat

Resolució d'incoació de l'expedient

Data: 14.1.97
 Signant: Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules

Data: 23.1.97
 Signant: Cap del Servei d'Assessoria Jurídica

Informe fiscal

Data: 3.2.97
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 94.177.550 PTA

Resolució d'aprovació de l'expedient

Data: 7.2.97
Signant: Secretari general
Import: 94.177.550 PTA
Procediment d'adjudicació: Negociat

Resolució d'adjudicació

Data: 24.2.97
Signant: Secretari general
Import d'adjudicació: 94.177.550 PTA
Coeficient de baixa: 0,1765
Adjudicatari: PACSA

Redacció i signatura del contracte

Data: 5.3.97
Signants: Secretari general
Representant PACSA
Import del contracte: 94.177.550 PTA

Fiança

Import: 3.767.102 PTA
Data: 5.3.97

Acta comprovació replanteig

Data: 7.3.97

LiquidacióActa de recepció

Data: 18.4.97

Expedient de liquidació

Data: 15.10.97
Signant: Arquitecte director de les obres
Import: 9.417.568 PTA

Resolució d'aprovació de la liquidació

Data:	17.10.97
Signant:	Secretari general
Import:	9.417.568 PTA

4.6. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (FASE II)**Actuacions preparatòries**Projecte

Data:	6.6.96
Signant:	Responsable àrea de Projectes i Obres de nova construcció
Pressupost d'execució material:	187.788.019 PTA
Despeses generals (13%):	24.412.443 PTA
Benefici industrial (6%):	11.267.281 PTA
IVA:	35.754.839 PTA
Pressupost de contracte:	259.222.582 PTA
Forma d'adjudicació:	Concurs
Procediment d'adjudicació:	Obert

Informe tècnic de supervisió

Data:	7.6.96
Signant:	Oficina de projectes i obres

Acord de Govern

Data:	16.4.96
Anualitats:	1996: 450.000.000 PTA
	1997: 350.000.000 PTA

Acta de replanteig previ

Data:	6.6.96
Signant:	Arquitecte de l'Oficina de Projectes i Obres

Aprovació tècnica del projecte

Data:	7.6.96
Signant:	Secretari general
Pressupost de contracte:	259.222.582 PTA
Anualitats:	1996/1997
Termini d'execució:	6 mesos
Forma d'adjudicació:	Concurs
Procediment d'adjudicació:	Obert

Resolució d'incoació de l'expedient

Data: 11.6.96
Signant: Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules

Data: 12.6.96
Signant: Cap del Servei d'Assessoria Jurídica

Informe fiscal

Data: 13.6.96
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 259.222.582 PTA
Anualitats: 1996/1997

Resolució d'aprovació de l'expedient

Data: 14.6.96
Signant: Secretari general
Import: 259.222.582 PTA
Forma d'adjudicació: Concurs
Procediment d'adjudicació: Obert

Publicació

Diari: DOGC
Data publicació: 17.6.96

Ofertes i proposicions

Nombre d'ofertes presentades: 4 licitadors
Oferta més elevada: 246.261.453 PTA
Oferta més baixa: 219.711.053 PTA

Resolució d'adjudicació

Data: 18.7.96
Signant: Secretari general
Import d'adjudicació: 219.711.053 PTA
Coeficient de baixa: 0,1524
Adjudicatari: PACSA

Comunicació a l'adjudicatari

Data: 24.7.96

Redacció i signatura del contracte

Data: 24.7.96
Signants: Secretari general
Representant PACSA
Import del contracte: 219.711.053 PTA

Fiança

Import: 10.368.903 PTA
Data: 24.7.96

Acta comprovació replanteig

Data: 31.7.96

Publicació de l'adjudicació

Diari: DOGC
Data publicació: 23.12.96

Liquidació

Acta de recepció

Data: 18.4.97

Expedient de liquidació

Data: 2.6.97
Signant: Arquitecte director de les obres
Import: 21.856.989 PTA

Resolució d'aprovació de la liquidació

Data: 2.6.97
Signant: Secretari general
Import: 21.856.989 PTA

4.7. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (COMPLEMENTARI FASE II)**Actuacions preparatòries**Projecte

Data:	14.1.97
Signant:	Responsable àrea de Projectes i Obres de nova construcció
Pressupost d'execució material:	30.174.239 PTA
Despeses generals (13%):	3.922.651 PTA
Benefici industrial (6%):	1.810.455 PTA
IVA:	5.745.175 PTA
Pressupost de contracte:	41.652.520 PTA
Procediment d'adjudicació:	Negociat

Informe tècnic de supervisió

Data:	15.1.97
Signant:	Oficina de projectes i obres

Acta de replanteig previ

Data:	15.1.97
Signant:	Arquitecte de l'Oficina de Projectes i Obres

Aprovació tècnica del projecte

Data:	16.1.97
Signant:	Secretari general
Pressupost de contracte:	41.652.520 PTA
Anualitats:	1997
Termini d'execució:	3 mesos
Procediment d'adjudicació:	Negociat

Resolució d'incoació de l'expedient

Data:	17.1.97
Signant:	Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules

Data:	23.1.97
Signant:	Cap del Servei d'Assessoria Jurídica

Informe fiscal

Data:	27.1.97
Signant:	Interventor delegat
Aplicació pressupostària:	12.05.610.02
Import:	41.652.520 PTA

Resolució d'aprovació de l'expedient

Data:	29.1.97
Signant:	Secretari general
Import:	41.652.520 PTA
Procediment d'adjudicació:	Negociat

Resolució d'adjudicació

Data:	18.2.97
Signant:	Secretari general
Import d'adjudicació:	41.652.520 PTA
Coefficient de baixa:	0,1524
Adjudicatari:	PACSA

Redacció i signatura del contracte

Data:	5.3.97
Signants:	Secretari general Representant PACSA
Import del contracte:	41.652.520 PTA

Fiança

Import:	1.666.101 PTA
Data:	5.3.97

Acta comprovació replanteig

Data:	7.3.97
-------	--------

Liquidació

Acta de recepció

Data:	18.4.97
-------	---------

Expedient de liquidació

Data:	12.1.98
Signant:	Arquitecte director de les obres
Import:	4.165.000 PTA

Resolució d'aprovació de la liquidació

Data:	12.1.98
Signant:	Secretari general
Import:	4.165.000 PTA

5. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS

D'acord amb el treball realitzat, a continuació exposem una sèrie d'observacions i recomanacions, amb la intenció de contribuir a la millora de la gestió de les despeses objecte de l'informe:

Núm. 1. L'aplicació pressupostària 13.03.600.01/1 Inversions en terrenys i béns naturals recull el pagament de 87 MPTA d'indemnitzacions per expropiació de terrenys, que inclouen 45 MPTA d'interessos de demora.

Aquests interessos haurien de ser registrats en el capítol III Despeses financeres.

Núm. 2. El Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, seguint el que disposa l'article 118 de la LCAP, estableix en l'article 3 que tots els contractes adjudicats per l'Administració de la Generalitat han de constar en el Registre Públic de Contractes, així com les modificacions, les pròrrogues o variacions de terminis i l'extinció dels contractes.

Hem comprovat que els contractes corresponents a l'Escola Judicial Fase I, Complementari, 94 MPTA, a l'Escola Judicial Fase II, 260 MPTA, i a l'Escola Judicial Fase II, Complementari, 42 MPTA, no s'han enviat a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per al seu registre.

Núm. 3. A principis de 1997, amb la finalitat d'establir dependències del Departament de Justícia, es van adquirir l'edifici del carrer Aragó, 332 i l'edifici del carrer Roger de Flor, 62, de la ciutat de Barcelona, per 1.475 MPTA i 1.025 MPTA, respectivament. Posteriorment, sobre aquests dos edificis s'han constituït sengles censos emfitèutics, en la modalitat de revessejats, en virtut de la qual, el propietari de l'edifici constitueix el cens rebent un import determinat (el cost d'adquisició referenciat anteriorment, en ambdós casos) i cedeix a un tercer el dret a rebre una prestació periòdica anual o quota censal, a la qual el propietari es compromet a fer front amb la garantia real del bé.

Durant 1997 per aquestes dues operacions únicament s'han registrat com a despeses les quotes censals pagades efectivament, un total de 189 MPTA. Per contra, no s'han registrat les operacions prèvies de compra dels edificis, en el pressupost de despeses, ni les de la venda posterior dels drets reals pel cobrament futur de les quotes censals, en el pressupost d'ingressos.

Núm. 4. Les obres del Palau de Justícia han finalitzat abans del termini previst, per la qual cosa dels 555 MPTA que s'han certificat, només s'han reconegut 302 MPTA per ajustar-ho a l'anualitat de l'exercici.

Núm. 5. Hem constatat que no es compleix el termini de dos mesos per al

pagament de les certificacions d'obres que estableix l'article 100.4 de la LCAP, ni el de sis mesos que l'article 148 de la mateixa llei estableix per a fer la liquidació i el pagament del saldo pendent des de l'acta de recepció. Tampoc no es paguen els interessos de demora que estableix la LCAP, en aquests casos.

Núm. 6. En l'article 64 Inversions en mobiliari i estris de 1997 hem detectat un import de 2,8 MPTA que, per la seva naturalesa, hauria d'haver-se imputat a l'article 63 Elements de transport.

Núm. 7. Hem calculat en aproximadament 588 MPTA l'import que a 31 de desembre de 1997 s'ha deixat de reconèixer com a obligacions per certificacions d'obres i compres de mobiliari i estris.

6. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS

A l'efecte previst per l'article 6 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol, el present Informe de Fiscalització fou tramès al Departament de Justícia.

La resposta del Departament de Justícia, una vegada conegut l'Informe, és la que transcrivim tot seguit:

"En resposta al vostre escrit, amb data 16 de novembre de 1998, al qual adjuntàveu el projecte d'informe de fiscalització 18/98-C, sobre inversions reals en el pressupost del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de l'exercici 1997, us informo que no considerem necessari utilitzar la via prevista a l'article 6 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol i, en conseqüència, no formulem cap al·legació.

No obstant això, permeteu-meu que us faci arribar algunes observacions amb l'únic objecte de poder explicar determinats aspectes de les observacions i recomanacions incloses en el projecte d'informe esmentat. Recomanacions que, d'altra banda, valorem molt positivament i que, sens dubte, ens serviran per assolir el nostre objectiu de millorar dia rera dia la gestió del pressupost del nostre Departament.

1. El pagament de 87 MPTA per indemnitzacions, corresponents a l'expropiació de terrenys del centre penitenciari Quatre Camins, inclouen interessos de demora, que havia de satisfer el Departament de Justícia, juntament amb el principal. Atès que aquest no disposa de capítol III, la imputació es va fer a la mateixa partida on s'imputarà el principal, és a dir, a la 12.03.600.01.

2. D'acord amb la disposició final de l'Ordre de posada en funcionament del sistema informàtic del registre públic de contractes, no s'havia de trametre cap dada a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació

Administrativa fins el dia d'entrada en vigor que era l'1 de març de 1997.

Els contractes anteriors a aquesta data no s'havien d'introduir al nou sistema informàtic. Per tant, tots els contractes adjudicats l'any 1996 estaven exempts d'aquest tractament. En aquest sentit, el contracte d'obres de l'Escola Judicial Fase II (260 MPTA) no es va comunicar a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa perquè es va adjudicar l'any 1996 i, per tant, entra dintre de la categoria dels contractes exempts. Malgrat això, la disposició transitòria de l'Ordre esmentada preveu que, per a la comunicació de dades referents a l'execució de contractes adjudicats amb anterioritat a l'entrada a la seva entrada en vigor, es requereix també la comunicació prèvia de les dades corresponents a l'adjudicació del contracte.

Així doncs, per comunicar les dades dels contractes d'obres de l'Escola Judicial Fase I Complementari (94 MPTA) i Escola Judicial Fase II Complementari (42 MPTA), s'haurien d'haver introduït les dades dels contractes d'origen, entre els quals es troba el contracte d'obres de l'Escola Judicial Fase II (260 MPTA).

Inicialment, no es van incloure, al nou sistema informàtic, cap dels tres contractes esmentats, sent la única causa de la manca de comunicació d'aquestes dades el canvi de sistema (fins l'1.03.97 era manual) que va induir a l'error de no transcriure dades quan no s'havien produït durant l'any 1997.

Posteriorment, un cop es va veure l'obligatorietat d'introduir dades anteriors a 1997, es van comunicar una sèrie de contractes d'aquestes característiques, entre ells els tres contractes esmentats, les dades dels quals ja obren en poder de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

3. El Departament de Justícia, que com a tal no disposa de pressupost específic d'ingressos (figuren tots al Departament d'Economia i Finances), tenia consignats en el seu pressupost per al 1997 els crèdits adients per atendre, al llarg de l'exercici, les quotes censals a satisfer pels edificis del carrer Aragó, núm. 332 i del carrer Roger de Flor, núm. 62, ambdós de Barcelona.

El Departament d'Economia i Finances és l'encarregat de realitzar la comptabilitat patrimonial i de pressupostar els ingressos per aquest concepte. Aquests edificis s'han donat d'alta en el patrimoni de la Generalitat de Catalunya com a actiu patrimonial.

4. L'import autoritzat en l'expedient plurianual de les obres de remodelació integral del Palau de Justícia (plurianual 95-98) per a l'annualitat de 1997, va ser de 400.000.000.-ptes.

Aquestes obres es van adjudicar a l'empresa PALAU DE JUSTÍCIA UTE, per un import total de 885.975.995,-ptes. L'import d'adjudicació de l'any 1997 era de 294.499.734,-ptes.

L'any 1997 es va tramitar un expedient d'obres complementàries per import de 84.997.514,-ptes, les quals no contemplava al projecte inicial.

D'acord amb el plec de prescripcions tècniques i el contracte signat amb l'empresa, aquesta va acabar les obres abans d'exhaurir la plurianualitat i va presentar la certificació d'obra corresponent a l'annualitat de 1998, que no va ser tramitada fins al mes de gener d'enguany, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i el contracte.

Conclusió: l'import total de certificacions presentades l'any 1997 pel projecte de remodelació integral va ser el següent:

294.499.734.-ptes (tramitada l'any 1997)

175.301.637.-ptes (tramitada l'any 1998)

469.801.371.-ptes

La resta fins a 555 milions correspon a l'expedient d'obres complementàries per un import de 84.995.514.-ptes.

5. Sobre aquesta part de l'informe cal dir que el tràmit corresponent al pagament de les certificacions d'obra l'efectua el Departament d'Economia i Finances.

6. A l'exercici de 1997, la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació no disposava de cap partida, a l'article 63, per a l'adquisició d'elements de transport. En la mesura del possible, les necessitats per aquest concepte es passaven per l'article 63 de la Secretaria General.

En un moment determinat, es va produir la necessitat urgent i inajornable de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació d'adquisició d'una furgoneta per al centre penitenciar de Quatre Camins i atès que no es disposava de saldo a l'article 63 de la Secretaria General, es va optar per tramitar-ho amb càrrec a l'article 64 que, en tractar-se d'equipament i mobiliari, responia a un concepte força equiparable al d'elements de transport.

7. D'acord amb l'article 7 de la Llei de pressupostos per a 1997, que estableix un mecanisme de retenció de saldos pressupostaris als efectes de corregir les desviacions entre ingressos i despeses, el Govern va acordar, en data 30 de setembre de 1997, el manteniment del saldo pressupostari corresponent a obligacions reconegudes dels capítols IV, VI i VII.

Per tant, el Departament de Justícia només va poder reconèixer les obligacions d'aquests capítols pressupostaris fins a 30 de setembre."

Sindicatura de Comptes de Catalunya
Jaume I, 2-4
08002 Barcelona
Tel. (+34) 93 270 11 61
Fax (+34) 93 270 15 70
sindicatura@sindicatura.org
www.sindicatura.org

Elaboració del document PDF: febrer de 2003

Dipòsit legal: B-12049-2003
